




Oktober 2012

Laporan Monitoring & Evaluasi Kota Banda Aceh

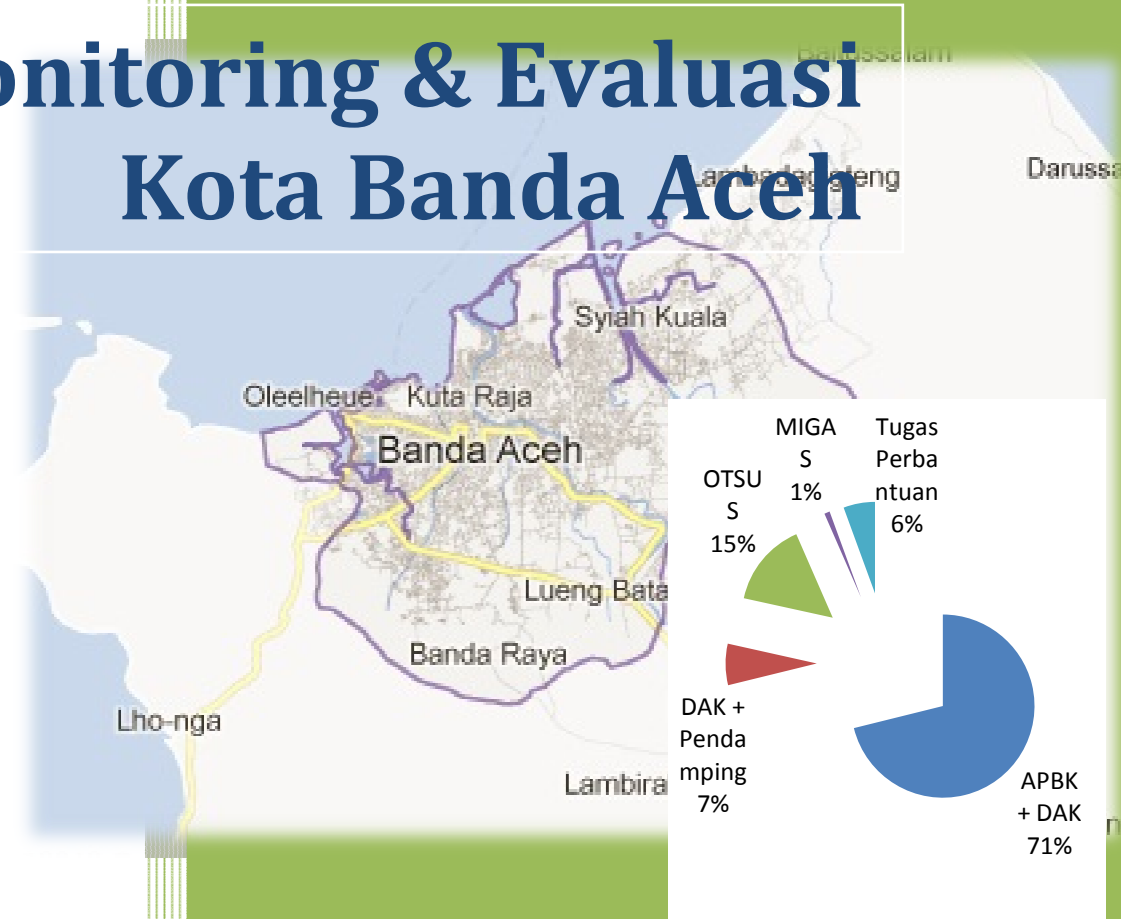


Bidang Penelitian, Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bappeda Kota Banda Aceh

Oktober 2012

Prosentase Total Realisasi Fisik dan Keuangan dari Seluruh Sumber Dana Pembiayaan Pembangunan Kota Banda Aceh Sampai Dengan Bulan Agustus 2012

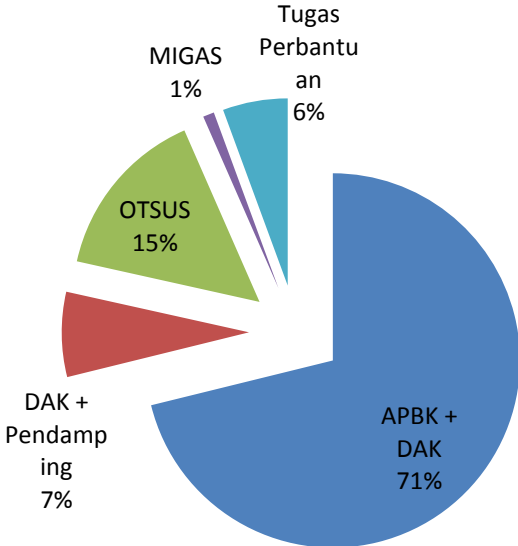Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	SKPD Pengguna Anggaran															
APBK + DAK	299.887.204.697	56,13	49,94	-	 <table><caption>Data for Realization Percentage Pie Chart</caption><thead><tr><th>Sumber Dana</th><th>Persentase (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>APBK + DAK</td><td>71%</td></tr><tr><td>OTSUS</td><td>15%</td></tr><tr><td>DAK + Pendamping</td><td>7%</td></tr><tr><td>Tugas Perbantuan</td><td>6%</td></tr><tr><td>MIGAS</td><td>1%</td></tr><tr><td>DPID</td><td>0%</td></tr></tbody></table>	Sumber Dana	Persentase (%)	APBK + DAK	71%	OTSUS	15%	DAK + Pendamping	7%	Tugas Perbantuan	6%	MIGAS	1%	DPID	0%
Sumber Dana	Persentase (%)																		
APBK + DAK	71%																		
OTSUS	15%																		
DAK + Pendamping	7%																		
Tugas Perbantuan	6%																		
MIGAS	1%																		
DPID	0%																		
DAK + Pendamping	30.888.293.000	47,91	37,96 (terhadap Kontrak)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Meuraxa Dinas Pekerjaan Umum , Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian															
OTSUS	63.001.746.972	71,22	51,32	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Meuraxa, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM															
MIGAS	4.130.544.000	77,19	64,68	Dinas Pekerjaan Umum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Syariat Islam															
Tugas Perbantuan	23.610.300.000	35.25	28,79	Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM															
DPID	-	-	-																

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	37.970.585.935	28,25	28,25	
DAK + Pendamping	10.589.445.000	0,00	0,00	Pendidikan untuk jenjang SD (Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pengadaan Perabot Perpustakaan SD, Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar Beserta Mobiler), Bidang Pendidikan Untuk Jenjang SMP/SMPLB (Rehabilitasi Berat Ruang Kelas Belajar, peningkatan mutu pendidikan)
OTSUS	8.904.167.972	77,68	59,69	Pembangunan Laboratorium Fisika, Kimia,Biologi dan Bahasa SMAN 7 Pengadaaan Komputer SMP/Mtsn Kota Banda Aceh Pengadaan Mobiler, Alat Laboratorium, buku dan rehap bangunan sekolah
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 1. Pembangunan Laboratorium Komputer SMPN 13 Banda Aceh



Gambar 2. Pembangunan Pagar SDN 53



Gambar 3. Pembangunan RKB SMAN 13 Banda Aceh



Gambar 4. Rehabilitasi SMAN 3 Banda Aceh



Gambar 5. Penyelesaian Pembangunan Ruang Kesenian SMAN 10 Fajar Harapan



Gambar 6. Penyelesaian Pembangunan Ruang OSIS SMAN 6



Gambar 7. Penimbunan Halaman Sekolah SMAN 12 Banda Aceh



Gambar 8. Rehab Bangunan Laboratorium SMAN 9



Gambar 9. Pembangunan Pagar SMAN 12 Banda Aceh



Gambar 10. Pengadaan Komputer Siswa SMAN 3 Banda Aceh (Otsus)



Gambar 11. Pengadaan Komputer Siswa SMPN 3, SMPN 16, SMPN 12 dan MTSN Rukoh Kota Banda Aceh (Otsus)



Gambar 12. Pengadaan Mobiler Siswa SMAN 3, SMAN 6, SMAN 9, SMAN 11 dan SMAN 14 Banda Aceh (Otsus)

2. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	9.638.088.873	61,58	46,89	
DAK + Pendamping	3.279.397.000	77,50	65,00	Pembangunan Revitalisasi Puskesmas Kuta Alam Tahap I, Pengadaan Bahan Obat-obatan
OTSUS	2.047.400.000	57,21	0,00	Pembangunan Gudang Farmasi dan pembangunan gedung Laboratorium serta Balai Pengobatan Bakti (tahap 2)
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	990.750.000	26,13	40,47	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Foto Dokumentasi:



Gambar 13. Pembangunan Revitalisasi Puskesmas Kuta Alam

3. Rumah Sakit Umum Meuraxa

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	36.403.570.356	73,02	66,82	
DAK + Pendamping	2.974.015.000	0,00	0,00	Pengadaan sarana prasarana kesehatan (Tempat tidur, Bed side cabinet dan over bed table, Bed Side Moitor Dewasa, Doppler, EKG, Elektro Surgical Cauter, Lampu Operasi Mobile, Meja Operasi, Suction Pump, Syringe Pump, Blood Bank Refigerator, dll)
OTSUS	9.742.000.000	37,22	37,60	Pembangunan Gedung IGD dan Administrasi tahap I dan Rumah Dokter
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 14. Pembangunan Gedung IGD

4. Dinas Pekerjaan Umum

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	38.969.411.720	49,75	49,45	
DAK + Pendamping	9.219.848.000	100,00	87,00	Pemeliharaan Jl kechik Saman, Gp ilie, AMD Cs, Pengadaan jaringan pipa tersier, Pembangunan MCK ++ Alue deah tengoh, deah glumpang, lampaseh
OTSUS	29.440.000.000	82,30	60,75	Pengadaan dan Pemasangan pipa PDAM dan Pengadaan water meter dan aksesoris (Cipta Karya) Pembangunan Jalan dan Jembatan (Bina Marga) Rehap dan Pembangunan Masjid
MIGAS	800.000.000	100,00	100,00	Pembangunan Jalan Dusun Meunasah Tuha, Gp. Ilie
Tugas Perbantuan	4.987.500.000	59,43	59,43	Pembinaan, pengawasan & penataan bangunan, lingkungan & rumah negara (PNPM)

Foto Dokumentasi:



Gambar 15. Pemasangan Pipa Tersier Wil.Tengku Dianjong (Otsus)



Gambar 16. Pembangunan Parit Asrama Gabungan Geuceu Meunara CS



Gambar 17. Pengadaan Water Meter dan Aksesoris (Otsus)



Gambar 18. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Lueng Bata



Gambar 19. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Ulee Kareng



Gambar 20. Pembangunan Balai Pengajian Gp. Lamdom



Gambar 21. Pembangunan MCK Plus Alue Deah Teungoh



Gambar 22. Pembangunan Mesjid Syuhada Gp.Lamgugop



Gambar 23. Pembangunan Dainase Kec. BandaRaya

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.472.207.333	32,60	32,60	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	400.000.000	96,72	82,89	Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Wilayah Timur
MIGAS	1.250.000.000	100,00	100,00	Pembangunan gudang logistik kebencanaan BPBD
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

6. Bappeda

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.694.774.657	81,46	53,16	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 24. Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja

7. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	5.573.035.720	90,12	70,55	
DAK + Pendamping	807.466.000	100,00	100,00	Pemasangan marka jalan, rambu tiang tunggal, RPPJ tiang portal & traffic light mesjid Raya Baiturahman
OTSUS	2.450.835.000	100,00	62,85	Rehabilitasi pembangunan pintu gerbang Terminal Type A dan Rehabilitasi Rambu Lalu Lintas (Traffic Light)
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 25. Pembangunan Pintu Gerbang Terminal Type A (Otsus)



Gambar 26. Pengaspalan dan Pembangunan Pintu Gebang Teminal L300



Gambar 27. Pembangunan Traffic Light Sp. Jam (Otsus)



Gambar 28. Pembangunan Area Parkir Ged.Pengujian Kendaraan Bermotor (Otsus)



Gambar 29. Rehab Traffic Light Sp.Dodik (Otsus)

8. Kantor Lingkungan Hidup

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.716.877.796	88,46	46,87	
DAK + Pendamping	1.321.991.000	49,16	49,16	Pengadaan incenerator, becak sampah, kontainer sampah, sumur resapan & IPAL
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

9. Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	35.060.113.151	63,56	71,15	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	1.900.000.000	75,00	29,09	Pembuatan Jaringan Instalasi dan KWH Meter PJU
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 30. Pembuatan Jaringan Instalasi dan KWH



Gambar 31. Meter PJU (Otsus)

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.223.476.340	72,85	42,55	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

11. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.831.123.950	31,04	31,04	
DAK + Pendamping	922.854.000	57,75	49,67	Pengadaan komputer, balai penyuluh KB kecamatan, furnitur balai, KIE kit, IUD KIT
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 32. Pengadaan BKB KIT (DAK)



Gambar 33. Pengadaan IUD KIT

12. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	4.657.590.200	51,71	68,03	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	807.050.000	41,57	42,13	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja Perluasan kesempatan kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Perluasan kesempatan kerja melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)

13. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	7.647.436.325	81,57	40,76	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	2.950.000.000	49,24	19,21	Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Ulee Lheue Pembuatan Master Plan Pengembangan Kawasan Wisata (Wisata Gampong Pande, Wisata Krueng Aceh, dan Kawasan wisata Ulee Lheu Tahap II) Pemasangan Iklan di Billboard Bandara Soekarno - Hatta
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 34. Pemasangan Iklan di Billboard Bandara Soekarno Hatta

14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.171.271.250	69,91	69,91	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

15. Satuan Polisi Pamong Praja dan WH

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.963.019.500	63,63	66,46	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

16. Sekretariat Kota

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	28.164.135.571	54,69	50,00	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

17. Sekretariat DPRK

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	19.626.702.675	39,70	39,30	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

18. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	13.023.420.183	45,28	41,38	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 35. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon



Gambar 36. Belanja Modal Pengadaan Mesin Porporasi



Gambar 37. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor



Gambar 38. Belanja Pemeliharaan Sarana/Prasarana Olah Raga dan Pendidikan



Gambar 39. Belanja Pemeliharaan Sarana/Prasarana Olah Raga dan Pendidikan



Gambar 40. Pemagaran Tanah Aset Pemerintah Kota Banda Aceh

19. Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.035.782.571	48,82	58,27	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

20. Inspektorat

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	837.800.000	73,15	75,03	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

21. Kecamatan Kuta Alam

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.831.458.200	70,31	67,21	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

22. Kecamatan Baiturrahman

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.020.053.500	80,58	81,18	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 41. Rehabilitasi Kantor Camat Baiturrahman Kota Banda Aceh

23. Kecamatan Meuraxa

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.272.730.000	56,41	54,03	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

24. Kecamatan Syiah Kuala

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.914.238.000	72,03	71,71	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

25. Kecamatan Banda Raya

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.482.449.050	55,98	55,98	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

26. Kecamatan Kuta Raja

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.146.230.411	73,58	72,87	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

27. Kecamatan Jaya Baru

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.454.466.825	73,41	72,97	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 42. Pelatihan Kader Posyandu



Gambar 43. Sosialisasi PBB



Gambar 44. Kegiatan Pembinaan Manajemen Desa

28. Kecamatan Lueng Bata

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.362.802.500	60,12	73,51	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

29. Kecamatan Ulee Kareng

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	1.440.840.000	67,04	65,72	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

30. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	581.048.000	65,86	55,62	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

31. Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPM)

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.583.462.816	65,84	46,03	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 45. Rehab kantor Geuchik Gamp[ong Iliie



Gambar 46. Pemb. Ktr Geucik Jeulingke



Gambar 47. Pembangunan Kantor Geuchik Lamseupung

32. Kantor Perpustakaan dan Arsip

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	433.739.000	80,65	78,48	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 48. Pengadaan Rak Buku



Gambar 49. Buku Ilmu Pengetahuan Umum



33. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	4.300.754.438	33,17	25,41	
DAK + Pendamping	1.773.277.000	91,95	0,00	Pembangunan tempat tambat boat alue deah tengah, asoe anggroe, lamjame, dan rehab saluran tambak
OTSUS	729.000.000	91,61	91,61	Pengadaan Mobil Box Coldstorage RPH
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	1.825.000.000	11,52	2,43	Pembangunan Pasar Batoh Pembangunan Cold Storage

Foto Dokumentasi:



Gambar 50. Penimbunan RPH banda Aceh



Gambar 51. Rehabilitasi prasarana RPH



Gambar 52. Pembangunan Bak Limbah dan Akses Jalan Masuknya



Gambar 53. Pengadaan Bibit Ikan Lele



Gambar 54. Pengadaan Cool Box (APBN)



Gambar 55. Pembangunan Pagar Pasar Hewan

34. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	5.899.031.600	41,58	33,24	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	4.438.344.000	35,05	30,43	Pembangunan Pasar Peuniti dan Fasilitas Pembinaan Industri Kecil dan Menengah
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	15.000.000.000	30,17	20,07	Pembangunan pasar percontohan di Pasar Aceh Kota Banda Aceh

Foto Dokumentasi:



Gambar 56. Pembangunan Pasar Peuniti (Otsus)

35. Dinas Syariat Islam

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	2.944.814.732	28,62	26,30	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	2.080.544.000	50,21	22,90	Pembinaan dan Pengembangan Syariat Islam dan Penyemarakkan Syiar Islam, serta Pembinaan Aqidah Umat
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

36. Sekretariat MPU

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	565.586.025	86,55	72,18	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

37. Sekretariat Majelis Adat Aceh

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	865.864.000	67,92	68,92	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

Foto Dokumentasi:



Gambar 57. Pengadaan Komputer/PC (4 Unit)



Gambar 58. Pengadaan Laptop (2 Unit)



Gambar 59. Pengadaan Filing Kabinet (2 Unit)

38. Sekretariat MPD

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	487.205.801	79,64	59,91	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-

39. Sekretariat Baitul Mal

Sumber Dana	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Rincian / Keterangan
APBK + DAK	11.620.005.693	93,84	19,74	
DAK + Pendamping	-	-	-	-
OTSUS	-	-	-	-
MIGAS	-	-	-	-
Tugas Perbantuan	-	-	-	-
